



**ÁREAS
IRREGULARES**
2023-2024

Áreas Irregulares | Parque Nobre e Meringuava

CRONOGRAMA PARQUE NOBRE

Etapa	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Projeto Executivo												
Execução da Obra – Elevatória												
Execução da Obra – Prefeitura												
Execução – Recalque												
Execução – Automação												




Estudo sobre a região de Meringuava:

- Projeto Executivo: fev/24
- Início licenciamento: mar/24
- Início execução: mai/24



Áreas Irregulares | Canal das Taxas

- **Projeto Canal das Taxas:** Concluído
- **Projeto Vila Amizade:** Concluído
- **Início licenciamento:** dez/2023

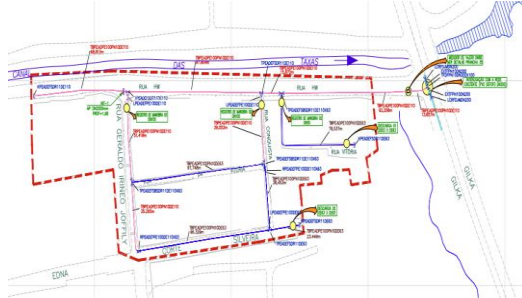

AÇÕES SOCIAIS

Pré-obra – durante a obra – pós obra



Diagnóstico da AI - Concluído fev/24

Reuniões de entrada - Concluído fev/24

Elaboração do plano de ação socioambiental – em curso mar/24

Reunião de partida + Plantão Social – previsto mar/24

Sensibilização e Adesão dos moradores ao projeto – ao longo da obra toda



Áreas Irregulares | Parque Dois Irmãos

- Obras na comunidade Parque Dois Irmãos em execução

Início: Jul/2023

Previsão de Conclusão: Out/2024

Extensão redes
ÁGUA
executadas

3.024
(m)

Extensão redes
ESGOTO
executadas

2.982
(m)

40%
da obra
concluída

Extensão de redes
previstas até final
de FEV 2024

SAA



2.485 m

SES



3.691 m

OUT/2023

NOV/2023

FEV/2024



Áreas Irregulares | Parque Dois Irmãos

Pontos de atenção do projeto

	Concluído
	Aguardando início da Prefeitura (Drenagem)
	Entrada em conjunto com a prefeitura (Drenagem)
	Aguardando revisão de projeto de drenagem (Resp. Prefeitura)
	Somente execução Iguá

Drenagem		Iguá	
Entrada	Entrega	Entrada	Entrega
-	-	-	-
01/05/24	sem prazo	-	-
26/02/24	30/04/24	26/02/24	03/05/24
sem prazo	sem prazo	-	-
-	-	04/03/24	06/05/24


RISCO

Sem data para executarmos **21%** da obra por influência da revisão do projeto de drenagem e início da drenagem em demais áreas.

Sendo:

14,6% área vermelha

6,4% área azul

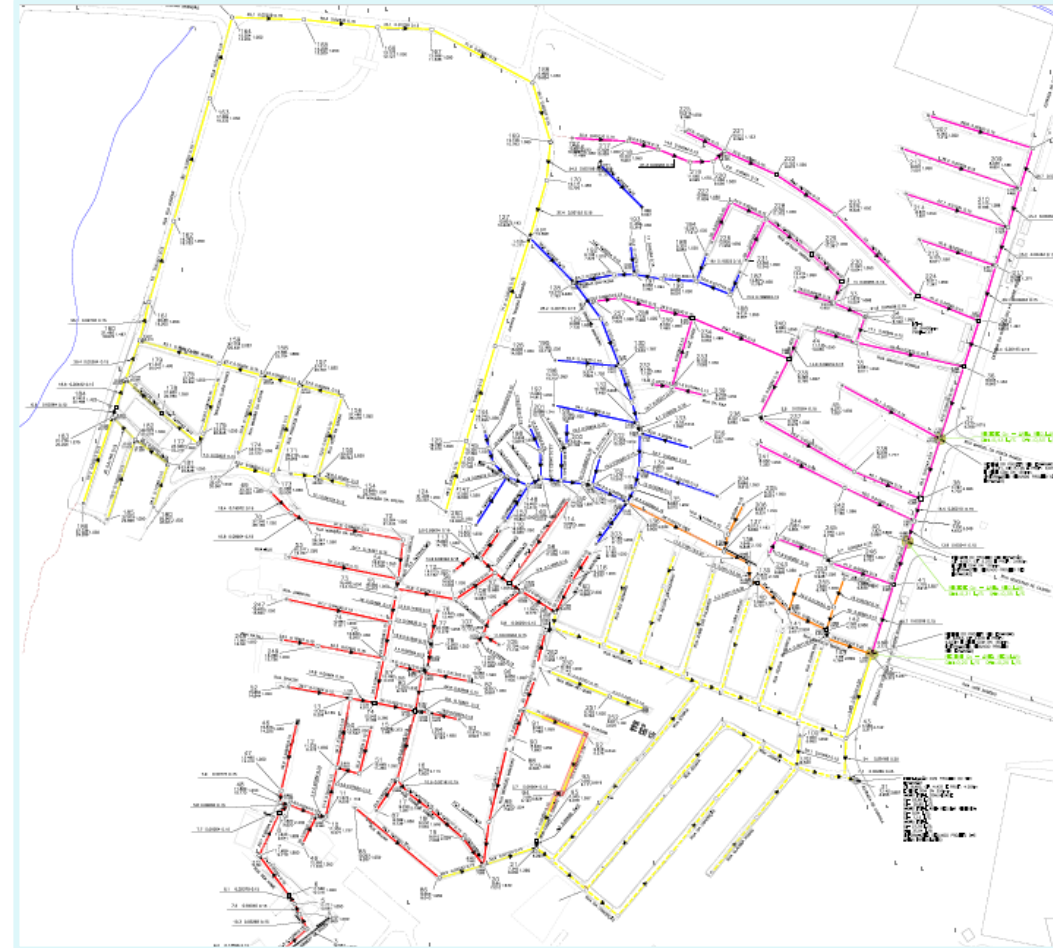

Áreas Irregulares | Execução 2024

- 7 Comunidades seguindo o sequenciamento definido pelo Comitê Gestor + antecipação de áreas irregulares solicitadas pela Prefeitura + Comunidades previstas no contrato de Perdas.

Áreas Irregulares

1. Parque Dois Irmãos
2. Parque Nobre
3. Meringuava
4. Canal das Taxas
5. Vila Amizade
6. Chácara do Tanque
7. Lagoa da Barra

5 comunidades SAA + SES

Água + Esgoto



2 comunidades

Ligações Novas



Legenda

Projetos
Licenciamento
Execução de Obras

Cronograma Áreas Irregulares: 2023-2024

Projetos e Obras	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25
Parque Dois Irmãos	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj		
Parque Nobre	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj		
Meringuava	Proj	Proj	Proj	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic
Canal das Taxas	Proj	Proj	Proj	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic
Vila Amizade	Proj	Proj	Proj	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic
Chácara do Tanque*															
Lagoa da Barra		Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj
Melhorias SAA			Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic	Lic

Não estavam previstas nas 21 do Projeto Pilotos

- Diagnóstico – Concluído
- Reuniões de entrada – Concluído
- Plano de ação socioambiental - em curso

Prefeitura: Obra Iguá: Ligações

* Cronograma de execução Iguá dependerá do cronograma da prefeitura.

Áreas Irregulares | Execução 2024/2025



Ex: Sítio Pai João - Tubulações e bombas ao longo das vielas.
