

ATA DE REUNIÃO

Assunto: 36ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 19/09/2018 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues	F.AB	Licenciamentos	droliveira@zonoestemais.com.br	
Daniel Moura	F.AB	Gerente	dmoura@zonoestemais.com.br	
Marcello Carvalhal	F.AB	Obras	marcelloramos@zonoestemais.com.br	
Daniel Gomes	F.AB	Obras	dgomes@zonoestemais.com.br	
Jorge Pinheiro	CET RIO	Ass. Tec.	jorge.pinheirojr@gmail.com	
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS	Gerente de fiscalização técnica	fernanda.oliveira@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Rafael Teixeira Veiga	CEDAE	Coordenador	rafaelveiga@cedae.com.br	
Luciene Velasques	CEDAE	Coordenadora	luciene-velasques@cedae.com.br	
Lideo Valle	SECONSERM A/SUBEC	Engenheiro	lideo.seconserva@gmail.com	
Manoel Dias de Assis	CEDAE	Assessor	massis30@hotmail.com	
Edson Mendonça	Casa Civil	Assessor	ebmbarros@gmail.com	
Jaime Leite	SUBEC/PCRJ	Coordenador	subec.conservacao@gmail.com	
Danilo Espírito Santo	ENCIBRA	Engenheiro	encibrario.danilo@gmail.com	
Bruno	SECONSERM A/19ª GC			


Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 21/11/2018
- b. Local: Rio-Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Concessionária.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:


- a) A Concessionária deverá enviar a ata de reunião para comentários dos membros participantes.

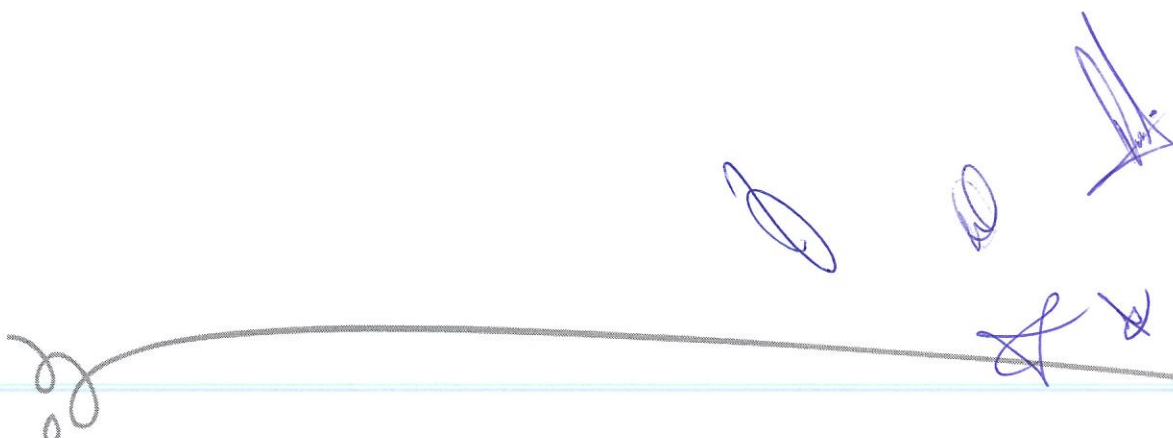Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page. There are several distinct signatures, including a large one on the right and smaller ones below it. A long, thin horizontal line is drawn across the bottom of the page, with a small scribble on the left side.

Assuntos Tratados:

- 1. Andamento das Obras da Concessionária:** Daniel Moura (F.AB Zona Oeste S.A.) apresentou os dois novos integrantes da equipe de obras, Marcello Carvalhal e Daniel Gomes e explicou as mudanças havidas no setor da engenharia da Concessionária e informou a atual situação das obras de implantação:
 - Rede Coletora: 275,2 km;
 - Coletor Tronco: 23,3 km;
 - Estações Elevatórias: 15
 - Linha de Recalque: 4.7 km
 - Sifões: 6
 - Travessias: 12
 - Ligações: 34,1 mil.
- 2. Andamento das Obras:** Daniel Moura informa que houve incremento da produção e aumento do número de frentes de obra e que, em função do pactuado na Sessão Conciliatória recém assinada. Daniel informou também que a sub-bacia MG12 foi concluída e já está sendo esgotada para a ETE Deodoro. Marcello informa que a obra da elevatória GC2.1 encontra-se mobilizada. Daniel Moura informa que as obras na sub-bacia TG1 avançaram, as da sub-bacia AF1 encontram-se em andamento e que 04 empresas já foram contratadas para sub-bacias do sistema Sarapuí.
- 3. Licenciamento de obras COR-VIAS:** Daniela (F.AB. Zona Oeste S.A.) informa que a elevatória da GC2 já está licenciada. A elevatória GC1.3 está em revisão para ser apresentada. As sub-bacias SR2 e SR3 encontram-se em análise na Rio-Águas/DAN, sendo que no momento a SR3 é a sub-bacia com a maior urgência. As sub-bacias SR1 e SR5 já possuem licença.
- 4. ETE Bangu:** Daniel apresenta a nova área onde será implantada a ETE Bangu, a mesma foi revista após a informação fornecida pelo Edson (Casa Civil) de que parte do terreno encontrava-se no Município de Nilópolis. Edson observa que com a nova localização é possível que a extensão do tronco fique menor. Daniel atenta para o fato de que, em contrapartida, o terreno atual é acidentado, sendo necessária a construção de uma elevatória e também que o emissário será maior. Eduardo questiona se o Exército já forneceu um prazo para assinatura do termo de cessão de uso e Daniel informa que as negociações com o Exército estão avançadas e que estima que dentro de 3 meses estejam concluídas, uma vez que a obra será realizada em 2019.
- 5. Pavimentação Ruas do Cacau e Jequitinhonha:** Eduardo (RIO-ÁGUAS) comenta que a pavimentação destas ruas foi uma demanda solicitada por diversos órgãos da PCRJ. Daniel informa que a mesma encontra-se resolvida e Eduardo sugere uma vistoria conjunta. Fernanda (RIO-ÁGUAS) informa que esteve no local e que para a Fundação Rio-Águas o reparo encontra-se satisfatório, devendo, no entanto, haver o parecer da Gerência de Conservação. Lídeo (SUBEC) comenta que em outras reuniões ficou acordada vistorias prévias aos locais das obras mais sensíveis. Daniel informa que a mesma foi realizada, principalmente por tratar-se de uma obra longa, cujo incomôdo para os moradores seria de aproximadamente 3 meses. Jorge Pinheiro (CET RIO) comenta que a vistoria foi realizada, inclusive com intervenção da CET RIO no plano

- de desvio de tráfego, desde sua elaboração até a aprovação e implementação.
6. **ETE João Lopes:** Daniel informa que desde junho do corrente ano a Concessionária não consegue concluir os 42 metros restantes de rede em função da violência na região.
 7. **SIURB:** Fernanda comenta que a ideia da PCRJ é migrar todo o cadastro para o SIURB e que haverá uma reunião entre IPP, RIO-ÁGUAS e Concessionária para definição dos parâmetros a serem adotados. Quanto à solicitação realizada por Carlos Tadeu (CEDAE) na última reunião, Daniel informa que não há relacionamento CEDAE-F.AB para envio total do cadastro, que em obras pontuais com possibilidade de interferência com alguma adutora, a consulta é realizada e inclusive, há acompanhamento, quando necessário da CEDAE nas frentes de obra em questão. Eduardo pontua que o link do ARcGIS, informado nas reuniões, é importante para a fiscalização das gerências responsáveis pelas frentes de obra, uma vez que, em caso de reclamação, há como consultar se o trecho específico já foi realizado ou não. Lídeo (SUBEC) informa que em contato com o IPP, a informação fornecida pelo referido órgão é de que a última "carga" realizada pela Concessionária no GEOVIAS foi em 2 de outubro de 2017. Lídeo observa que as atualizações devem ser mensais.
 8. **Hidrômetros:** Daniel comenta que a área comercial foi consultada e que não há custo para o usuário no momento da padronização. Quanto ao questionamento do Robson França da SMUIH realizado na última reunião, Daniel informa que houve reunião entre a SMUIH e Sub-secretaria de Conservação onde o modelo adotado foi aprovado. Quanto a retirada do hidrômetro antigo, Daniel informa que a premissa é sempre retirar o hidrômetro antigo, entretanto há moradores que não se encontram em casa ou ainda que se opõem a retirada.
 9. **Vila Kennedy:** Daniel Moura informa que as obras da ETE Vila Kennedy estão mobilizadas, com início da execução do canteiro de obras. Comenta sobre as dificuldades devido ao problema de segurança na região. Edson pergunta sobre a bacia de esgotamento contribuinte à ETE. Daniel informa que a nova ETE foi projetada para tratar uma vazão de 70 l/s. Informa que a rede no entorno da UPA está interligada. Já a parte norte de Vila Kennedy (região do Quafá) tem como previsão o Sistema Sarapuí, com tratamento na futura ETE Bangu. Edson alerta para a parte sul, onde passa adutora da CEDAE, pois há uma região que não possui rede.
 10. **Base Aérea de Santa Cruz (BASC):** Daniel informa que, dentre os pontos acordados na Sessão Conciliatória, está a execução da rede de esgotamento sanitário interna na BASC. A previsão de início das obras é para novembro.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Handwritten signature in black ink at the bottom left of the page.
